



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE REDACCIÓN, DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DEL PROYECTO “ADECUACIÓN DEL CENTRO COMARCAL DE ORTIGOSA DE CAMEROS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE ORTIGOSA DE CAMEROS (LA RIOJA)”

1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL SERVICIO

La evolución de las exigencias normativas y operativas ha exigido la redimensión de las infraestructuras existentes conocidas como Centros Comarcales.

Inicialmente, en los años 80, el objetivo perseguido desde el Gobierno de La Rioja, era diseñar cocheras/garajes con espacio adicional para taquillas del personal que trabaja en la zona. En los años 2000 se promovió por parte del Gobierno de la Rioja que esas cocheras/garajes pasasen a denominarse Centros comarcales con la implicación laboral técnica de “centro de trabajo”. Esto conllevaba la realización de vestuarios masculinos y femeninos, así como espacio para taquillas para el personal de trabajo, zona de estar y espacio para albergar vehículos que desarrollaban sus funciones en la zona.

Posteriormente, con los años, las necesidades fueron evolucionando hacia la incorporación o habilitación de zonas de estancia (sala de reuniones, zonas de descanso, instancias multiuso, etc.)

Esta evolución de estos centros comarcales por su singularidad dentro de las emergencias de incendios forestales, ha hecho que desde hace años se vengán planificando con un dimensionamiento mucho mayor de los diseños/prototipos iniciales.

Actualmente las instalaciones que dispone el retén de incendios forestales de Ortigosa en su centro comarcal apenas llegan a los 100 m², por lo que los espacios son absolutamente insuficientes para cumplir con todos los requerimientos. Las necesidades actuales son las siguientes:

- Estancias de obligado cumplimiento normativo como sala de reuniones y/o sala de estar.
- Ampliación de la zona de garaje-almacén. Actualmente debido a su reducido tamaño, el segundo vehículo del retén, así como material de suministro necesario para el ejercicio de sus funciones, se está llevando a otras ubicaciones.
- Redimensionamiento de la zona de vestuarios. El incremento de personal en los retenes a 8 o 9 integrantes, hace que en el actual centro no existan el número de vestuarios suficientes, con sus taquillas y bancos necesarios.

Ante estas necesidades, el Gobierno de la Rioja propuso la compra de las estancias del mismo edificio en el que se sitúa actualmente el centro comarcal, y que son propiedad del ayuntamiento de Ortigosa de Cameros para poder acometer la ampliación y adecuación del mismo. Estas estancias son una planta primera y la mitad de la planta baja que linda con la actual estancia donde se ubica el centro comarcal.

El edificio a adecuar es una vivienda ubicada en la Calle Pajares Alberco nº 8 con Ref. catastral nº 5394010WM2669S0001EX con una superficie de 364 m² y uso según el Plan General Municipal como residencial. Este inmueble es propiedad del Gobierno de La Rioja. El 6 de junio de 2025, se refrendó por parte

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE			en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES . Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.	Pág. 1 / 23
Expediente	Tipo	Procedimiento	Nº Documento	
00860-2025/102119	Pliego PT	Solicitudes y remisiones generales	2025/0746774	
Cargo		Firmante / Observaciones	Fecha/hora	
1 Jefe Sección Protección Forestal		Luis Isaac Berrueto Vegas	18/08/2025 20:21:13	
2 Jefe Servicio de Conservación de la Naturaleza y Planificación		Carlos Muro Martinez de Quel / Visto Bueno.	19/08/2025 10:03:15	
3 SELLADO ELECTRÓNICAMENTE por Gobierno de La Rioja.		Este documento es una copia fidedigna del almacenado en el repositorio central de documentos electrónicos		19/08/2025 10:03:19

del ayuntamiento de Ortigosa de Cameros la enajenación onerosa del bien patrimonial con la referencia catastral referida mediante adjudicación directa al Gobierno de La Rioja.

2. OBJETO

El objeto de la propuesta consiste en la redacción del proyecto para la adecuación del centro comarcal de Ortigosa de Cameros en el Término Municipal de Ortigosa de Cameros.

El objeto del presente contrato de servicios es el siguiente:

- 1- Redacción del proyecto de “ADECUACIÓN DEL CENTRO COMARCAL DE ORTIGOSA DE CAMIEROS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE ORTIGOSA DE CAMEROS (LA RIOJA)”
- 2- Dirección de obra y dirección de ejecución del proyecto durante la ejecución.
- 3- Coordinación de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra

3. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS A PROYECTAR

La nave almacén dispone de 2 plantas. La planta baja será destinada a garaje- almacén, la planta superior a aseos-vestuarios y sala de reuniones.

Uso catastral	Parcela catastral total (m²)	Superficie Construida comprobada (m²)	Superficie Útil comprobada (m²)	Superficie Adoptada (m²)
Almacén	364,00	433,80	393,66	433,80

Planta baja

- Su destino principal es el de garaje – almacén.
- La planta baja deberá albergar espacio para al menos 4 vehículos estilo “pick up” y espacio para almacenamiento de material de trabajo de retenes.
- Se diseñará con un aseo/lavabo en la planta baja.
- Una zona de la planta baja deberá albergar taquillas/perchas con bancos corridos definido como “zona sucia”.
- Contará con facilidades para la limpieza y carga de agua de pick up de IIFF.
- Deberá estar dotado de electricidad.

Planta primera.

- Se dotará en la planta primera de vestuarios y aseos para un retén de 9 operarios según lo establecido en el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
- Igualmente incluirá en la planta primera se diseñará sala reuniones y una sala de descanso con cocina donde pudiese permanecer el retén los tiempos de espera o descanso. Estas zonas estarán dotadas con calefacción-aire acondicionado.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE			en formato PDF/A 1.7 Firma PADES. Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.	Pág. 2 / 23
Expediente	Tipo	Procedimiento		Nº Documento
00860-2025/102119	Pliego PT	Solicitudes y remisiones generales		2025/0746774
Cargo		Firmante / Observaciones		Fecha/hora
1 Jefe Sección Protección Forestal		Luis Isaac Berrueto Vegas		18/08/2025 20:21:13
2 Jefe Servicio de Conservación de la Naturaleza y Planificación		Carlos Muro Martínez de Quel / Visto Bueno.		19/08/2025 10:03:15
3 SELLADO ELECTRÓNICAMENTE por Gobierno de La Rioja.		Este documento es una copia fidedigna del almacenado en el repositorio central de documentos electrónicos		19/08/2025 10:03:19

Deberá diseñarse un sistema de calefacción eficiente para todo el edificio, así como toda la instalación de luz, agua, fecales e internet.

En cuanto al diseño de las diferentes estancias a proyectar se presentará un estudio de diferentes alternativas.

4. COORDINACIÓN Y VIGILANCIA DEL SERVICIO CONTRATADO

Los servicios técnicos de la Dirección General de Medio Natural y Paisaje (DGMNyP) serán los encargados de la coordinación y seguimiento del trabajo a realizar, así como del cumplimiento de este Pliego y vigilancia de la elaboración del Proyecto.

Son funciones de los servicios técnicos de la DGMNyP:

- Ejercer la inspección y vigilancia continuada del trabajo contratado.
- Interpretar la documentación contractual, para la correcta ejecución del contrato.
- Exigir la existencia de las personas, medios y organización, que consta en la documentación contractual para la Redacción del Proyecto.
- Proponer los criterios a tener en cuenta en el desarrollo del Proyecto, y en especial los referentes a tipos y calidades de materiales y precios descompuestos utilizados en la confección del presupuesto final del Proyecto de ejecución.
- Tramitar y resolver cuantas incidencias surjan en la fase de Redacción del Proyecto y posterior Ejecución de la Obra.

Para la ejecución de los trabajos a los que se refiere el presente Pliego de Prescripciones Técnicas se nombrará al Director de Servicio de entre los funcionarios adscritos a la propia Dirección General.

El Director del Servicio, desempeñará las funciones de coordinación e interpretación y propondrá la modificación y suspensión, en su caso, del contrato a que se refiere el presente Pliego de Prescripciones Técnicas; y, además, las siguientes funciones:

- Velar por el cumplimiento de los trabajos contratados en la condiciones y plazos establecidos.
- Seguimiento continuo y permanente de la evolución del proyecto con los adjudicatarios del contrato.
- Aprobar el Plan de Trabajo propuesto por los Adjudicatarios, fijando los plazos y los ritmos parciales de desarrollo de los trabajos contratados.
- Llevar a cabo las reuniones de seguimiento y revisiones técnicas que resulten necesarias para la supervisión y control de los plazos, fases y trabajos que forman parte del encargo.
- Validar las certificaciones de obra presentadas por la Dirección Facultativa y tramitarlas para su abono ante el órgano correspondiente de la administración.
- Autorizar y facilitar a los adjudicatarios los contactos con otros organismos oficiales en relación con el desarrollo de los trabajos.
- Preparar la recepción y liquidación de cada una de las fases del contrato.

El Director del Servicio, en ningún caso, será responsable, ni directa, ni solidariamente, de las actividades que, con plena responsabilidad técnica y legal, deba desarrollar el Adjudicatario para el cumplimiento de los trabajos encomendados.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES. Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.

Pág. 3 / 23

Expediente	Tipo	Procedimiento	Nº Documento
00860-2025/102119	Pliego PT	Solicitudes y remisiones generales	2025/0746774
Cargo	Firmante / Observaciones		Fecha/hora
1 Jefe Sección Protección Forestal	Luis Isaac Berruero Vegas		18/08/2025 20:21:13
2 Jefe Servicio de Conservación de la Naturaleza y Planificación	Carlos Muro Martinez de Quel / Visto Bueno.		19/08/2025 10:03:15
3	SELLADO ELECTRÓNICAMENTE por Gobierno de La Rioja. Este documento es una copia fidedigna del almacenado en el repositorio central de documentos electrónicos		19/08/2025 10:03:19

5. DIRECCIÓN, EQUIPO, ORGANIZACIÓN Y RESPONSABILIDADES DEL ADJUDICATARIO.

El adjudicatario designará expresamente a una persona, con el carácter de Representante del Adjudicatario, que será el responsable principal del Equipo Redactor del Proyecto y el interlocutor con los servicios técnicos de la Dirección General.

El Equipo Redactor del Proyecto estará compuesto, al menos, por los siguientes profesionales, de entre los cuales se nombrará al Representante del Adjudicatario que será quién se coordine con la Dirección del Servicio:

- Un Arquitecto y/o Arquitecto técnico o titulaciones equivalentes.

Los profesionales pertenecientes al Equipo Redactor del Proyecto, que intervengan en los trabajos objeto del contrato, deberán estar en posesión de la correspondiente titulación que les capacite, de acuerdo con la legislación vigente, para poder firmar el trabajo realizado, y validarán con su firma todos y cada uno de los documentos que correspondan en cada caso.

El adjudicatario del contrato será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrollen, así como de las consecuencias que se puedan derivar a la Administración o a terceros debidas a insuficiencias técnicas, defectos u omisiones de requisitos legales que el trabajo pueda presentar.

6. RELACIÓN DE TRABAJOS, FASES Y PLAZOS DE EJECUCIÓN.

Los trabajos objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas se desarrollarán de acuerdo con las siguientes Fases y Plazos:

FASE 1. Redacción del Proyecto de Ejecución. (Plazo de ejecución: TRES MESES desde la adjudicación del encargo)

FASE 2. Dirección de obra, Dirección de la Ejecución y Coordinación de Seguridad y Salud (Plazo de ejecución: el de duración de la ejecución de las obras hasta la recepción definitiva de las mismas, estimado inicialmente en 8 MESES).

7. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto deberá elaborarse teniendo en cuenta las indicaciones que pudiera hacer el Director del Servicio, relativas a la funcionalidad de las instalaciones.

El proyecto será visado por el Colegio de Arquitectos y contará con todos los documentos necesarios para su contratación administrativa y correcta ejecución de las obras.

8. PLAZOS Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS

Una vez realizada la redacción del proyecto de forma conforme, y comprobada la viabilidad de su ejecución, se entregarán copia en formato digital del proyecto, así como una en formato editable del mismo.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE			Pág. 4 / 23
en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES. Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.			
Expediente	Tipo	Procedimiento	Nº Documento
00860-2025/102119	Pliego PT	Solicitudes y remisiones generales	2025/0746774
Cargo		Firmante / Observaciones	Fecha/hora
1	Jefe Sección Protección Forestal	Luis Isaac Berruero Vegas	18/08/2025 20:21:13
2	Jefe Servicio de Conservación de la Naturaleza y Planificación	Carlos Muro Martínez de Quel / Visto Bueno.	19/08/2025 10:03:15
3	SELLADO ELECTRÓNICAMENTE por Gobierno de La Rioja. Este documento es una copia fidedigna del almacenado en el repositorio central de documentos electrónicos		19/08/2025 10:03:19

El proyecto deberá entregarse en el plazo de 3 meses para su supervisión por parte de la Dirección General de Medio Natural y Paisaje, a partir de la adjudicación del trabajo. Una vez supervisado por la oficina de supervisión de la DGMNyP, se entregará visado por el colegio oficial correspondiente para su tramitación.

9. PRESUPUESTO Y FORMA DE CONTRATACIÓN

El presupuesto base de licitación del presente contrato asciende a la cantidad de CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DIEZ EUROS (49.610,00 €) IVA incluido, de acuerdo con el siguiente desglose:

- Honorarios Redacción Proyecto Adecuación Centro Comarcal	25.000,00 €
- Honorarios Dirección de Obra	9.000,00 €
- Honorarios Dirección de Ejecución	3.000 €
- Honorarios Coordinación Seguridad y Salud	4.000 €
Total Honorarios.....	41.000 €
IVA.....	8.610,00 €
TOTAL PRESUPUESTO	49.610,00 €

10. FINANCIACIÓN

Se realizará con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja para el ejercicio 2025.

11. PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO DEL DIRECTOR DEL SERVICIO

Se propone el nombramiento como Director del Servicio a D. Luis Isaac Berruero Vegas, Jefe de Sección de Protección Forestal de la Dirección General de Medio Natural.

12. CONDICIONES DE LA ADJUDICACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS.

El licitador que resulte Adjudicatario del contrato (en adelante el Adjudicatario) prestará los servicios objeto del contrato de forma tal, que ningún acto u omisión pueda provocar que el Órgano de Contratación esté incumpliendo la ley, las normas municipales, autonómicas o estatales, las condiciones de las licencias del proyecto o cualquier otra reglamentación aplicable, así como cualquier contrato que se celebre entre el Órgano de Contratación y terceros en relación con la promoción y construcción de las obras objeto del proyecto y, especialmente, el Adjudicatario se hace responsable de que no se perjudiquen cualesquiera garantías que disponga el Órgano de Contratación en relación con el contrato de obras y su ejecución.

Del mismo modo, el Adjudicatario será responsable de las calidades, plazos y presupuesto que resulten de su propuesta proyectada, por lo que, en caso de desviarse de los mismos, se le aplicarán las penalizaciones que se detallan en el PCAP.

Toda la documentación de la que se hace entrega a los licitadores tiene carácter vinculante para aquéllos y para quien resulte Adjudicatario de la licitación del contrato.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES . Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.

Pág. 5 / 23

Expediente	Tipo	Procedimiento	Nº Documento
00860-2025/102119	Pliego PT	Solicitudes y remisiones generales	2025/0746774
Cargo	Firmante / Observaciones		Fecha/hora
1 Jefe Sección Protección Forestal	Luis Isaac Berruero Vegas		18/08/2025 20:21:13
2 Jefe Servicio de Conservación de la Naturaleza y Planificación	Carlos Muro Martinez de Quel / Visto Bueno.		19/08/2025 10:03:15
3 SELLADO ELECTRÓNICAMENTE por Gobierno de La Rioja.	Este documento es una copia fidedigna del almacenado en el repositorio central de documentos electrónicos		19/08/2025 10:03:19

El desconocimiento de este pliego, en cualquiera de sus términos o de las instrucciones, pliegos o normas de toda índole que puedan tener aplicación en la ejecución de lo pactado, no eximirá al Adjudicatario de la obligación de su cumplimiento.

En ningún caso podrán servir las normas contenidas en este pliego para justificar la omisión de estudios o descripciones que, por la legislación vigente, deban integrar el proyecto, o vengan exigidas por las características específicas de la obra, o bien, que a juicio del Director del Proyecto deban formar parte de este.

El Adjudicatario pondrá su máxima diligencia, cuidado y profesionalidad, utilizando su experiencia, competencia y capacidad de ejecución de proyectos y direcciones de obra.

El Adjudicatario deberá prestar la cobertura técnica necesaria con el fin de que el Órgano de Contratación pueda obtener las autorizaciones, permisos, licencias y documentos necesarios para el correcto desarrollo de las obras. Del mismo modo facilitará cualquier información, tanto oficial como particular, así como los documentos o información, tanto oficiales como particulares, necesarias para su realización.

El contrato firmado entre las partes permanecerá en vigor hasta la finalización del mismo, ello sin menoscabo de la subsistencia de los plazos de prescripción de las responsabilidades de las partes, que serán los establecidos en las leyes.

El abono del precio del contrato que resulte del proceso de adjudicación, se realizará de acuerdo con los siguientes criterios:

FASE		PROCEDIMIENTO DE ABONO
FASE 1	Redacción del Proyecto	Una certificación tras la supervisión del proyecto.
FASE 2	Dirección de obra del Proyecto y coordinación de seguridad y salud	Certificaciones emitidas proporcionalmente a la ejecución de las obras

13. NORMATIVA A LA QUE HA DE SUJETARSE LOS SERVICIOS CONTRATADOS.

Serán de aplicación, además del presente Pliego y el de Cláusulas Económico-Administrativas Particulares del Contrato, las Leyes, Reglamentos, Ordenanzas, Pliegos Oficiales de Prescripciones Técnicas Generales, Instrucciones Oficiales y Normas de obligado cumplimiento que, siendo vigentes durante el desarrollo del Contrato, afecten directa o indirectamente a la ejecución de las obras objeto del mismo.

El Director del Servicio podrá exigir el cumplimiento de las disposiciones contenidas en las citadas disposiciones, en todo aquello que no esté expresamente especificado en el presente Pliego, tanto en lo que se refiere a la calidad de los materiales como a las condiciones de su puesta en obra y al modo de ejecutar las mismas.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE			Pág. 6 / 23
en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES. Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.			
Expediente	Tipo	Procedimiento	Nº Documento
00860-2025/102119	Pliego PT	Solicitudes y remisiones generales	2025/0746774
Cargo		Firmante / Observaciones	Fecha/hora
1 Jefe Sección Protección Forestal		Luis Isaac Berrueto Vegas	18/08/2025 20:21:13
2 Jefe Servicio de Conservación de la Naturaleza y Planificación		Carlos Muro Martínez de Quel / Visto Bueno.	19/08/2025 10:03:15
3 SELLADO ELECTRÓNICAMENTE por Gobierno de La Rioja.		Este documento es una copia fidedigna del almacenado en el repositorio central de documentos electrónicos	

En consecuencia, serán de aplicación, al menos, las disposiciones que, sin carácter limitativo y atendiendo a sus ulteriores modificaciones, se señalan a continuación, las cuales se designarán, en general, cuando se haga referencia a ellas, con las abreviaturas que así mismo se indican.

Legislación Estatal

- Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
- Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil.
- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014
- Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
- Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
- Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.
- Real Decreto 445/2023, de 13 de junio, por el que se modifican los anexos I, II y III de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
- Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado (PCAG).
- Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.
- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.

Legislación Autonómica

- Ley 2/1995, de 10 de febrero de 1995, de Protección y desarrollo del patrimonio forestal en La Rioja.
- Ley 6/2017, de 8 de mayo, de Protección del Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
- Decreto 114/2003, de 30 de octubre de 2003, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 2/1995, de 10 de febrero de 1995, de Protección y desarrollo del patrimonio forestal en La Rioja.
- Decreto 31/2017, de 30 de junio, por el que se aprueba el Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales en la Comunidad Autónoma de La Rioja (INFOCAR)
- Decreto 29/2018, de 20 de septiembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo del Título I "Intervención Administrativa" de la Ley 6/2017 de Protección de Medio Ambiente de La Rioja
- Orden sobre prevención y lucha contra incendios forestales vigente en el momento de la ejecución del Proyecto o memoria.
- Decreto 18/2019, de 17 de mayo, por el que se aprueba la Directriz de Protección del Suelo No Urbanizable de La Rioja

Normativa complementaria

Toda la normativa anterior se completará con:

- Normas UNE de aplicación y declaradas de obligado cumplimiento.
- Normas Técnicas españolas y extranjeras a las que explícitamente se haga referencia en el articulado de este Pliego, o cualquier otro documento de carácter contractual.

Así mismo, en el desarrollo de los trabajos, se seguirán las disposiciones vigentes en materia de Seguridad y Salud, destacando entre ellas:

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE			Pág. 7 / 23
en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES. Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.			
Expediente	Tipo	Procedimiento	Nº Documento
00860-2025/102119	Pliego PT	Solicitudes y remisiones generales	2025/0746774
Cargo		Firmante / Observaciones	Fecha/hora
1	Jefe Sección Protección Forestal	Luis Isaac Berruero Vegas	18/08/2025 20:21:13
2	Jefe Servicio de Conservación de la Naturaleza y Planificación	Carlos Muro Martínez de Quel / Visto Bueno.	19/08/2025 10:03:15
3	SELLADO ELECTRÓNICAMENTE por Gobierno de La Rioja. Este documento es una copia fidedigna del almacenado en el repositorio central de documentos electrónicos		19/08/2025 10:03:19

- Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.
- Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.
- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, Prevención de Riesgos Laborales.
- Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención en la construcción.
- Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, Disposiciones mínimas de seguridad y salud. Equipos de protección individual.
- Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, de Disposiciones mínimas de seguridad y salud en la construcción.
- Real Decreto 842/2002, de 2 agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
- Convenio Colectivo Provincial de la Construcción.
- Otros preceptos sobre Seguridad y Salud en el trabajo contenidas en las ordenanzas laborales, reglamentos de trabajo, convenios colectivos y reglamentos de régimen interior en vigor.

Serán de aplicación las disposiciones oficiales que sustituyan, modifiquen o completen a las citadas en la relación anterior, así como las nuevas disposiciones que se publicasen, siempre que sean de obligado cumplimiento en la ejecución de las obras y antes de su contratación.

Aquellas Normas Técnicas relativas a características y métodos de ensayo de materiales cuya designación indique el año de su redacción, no podrán ser sustituidas por otras de fecha diferente. Cuando la designación de la norma no especifique la fecha de su redacción se entenderá que deberá adoptarse la correspondiente al momento de aprobación del Proyecto o memoria.

El contratista está obligado al cumplimiento de las Instrucciones, Pliegos o Normas de toda índole promulgadas por la Administración, y que tengan aplicación en los trabajos a realizar, tanto si están citadas en la relación anterior como si no lo están, quedando a decisión del Director del Servicio resolver cualquier discrepancia que pudiera existir entre ello y lo dispuesto en este Pliego.

Será de obligado cumplimiento cuanto se dispone en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, así como en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, y en el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado (PCAG).

14. CARACTERÍSTICAS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

El contrato se ejecutará de acuerdo con las fases especificadas en el apartado 6 del presente pliego. Una vez concluidos los trabajos correspondientes a cada fase, y con anterioridad al inicio de los comprendidos en la siguiente, deberá emitirse conformidad por el Director del Servicio aprobando los trabajos realizados hasta ese momento y autorizando el cambio de fase.

El Órgano de Contratación se reserva el derecho a suspender los trabajos objeto de la 2ª, si del resultado de la 1ª Fase se concluyera la inviabilidad de la actuación por cuestiones urbanísticas, normativas, económicas y/o

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES . Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.

Pág. 8 / 23

Expediente	Tipo	Procedimiento	Nº Documento
00860-2025/102119	Pliego PT	Solicitudes y remisiones generales	2025/0746774
Cargo	Firmante / Observaciones		Fecha/hora
1 Jefe Sección Protección Forestal	Luis Isaac Berrueto Vegas		18/08/2025 20:21:13
2 Jefe Servicio de Conservación de la Naturaleza y Planificación	Carlos Muro Martinez de Quel / Visto Bueno.		19/08/2025 10:03:15
3	SELLADO ELECTRÓNICAMENTE por Gobierno de La Rioja. Este documento es una copia fidedigna del almacenado en el repositorio central de documentos electrónicos		19/08/2025 10:03:19

de tramitación sectorial o administrativa. En caso de que el Órgano de Contratación decida la no continuación de las mismas, ello no dará lugar a indemnización alguna a favor de los Adjudicatarios.

El contrato de servicios deberá desarrollarse, además, con sujeción a las prescripciones de este pliego y especialmente a aquellos criterios generales que se exponen a continuación:

- Se deberá tener especialmente en cuenta la elección adecuada de soluciones constructivas y materiales empleados para la reducción de los futuros costes de mantenimiento.

15. MODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

a. Riesgo y ventura.

El adjudicatario ejecutará el objeto de este contrato a su riesgo y ventura, con medios humanos y materiales, propios o ajenos, y cumplirá las obligaciones que deriven de la LCSP, así como de todas las legislaciones cuyo ámbito pudiera verse afectado y las contenidas en la demás normativa de aplicación, ajustándose a lo especificado en la Documentación Contractual y a lo que resulte conforme con las reglas de la buena construcción.

El Adjudicatario quedará exento de responsabilidad cuando un trabajo defectuoso sea consecuencia de una orden expresa y por escrito del Órgano de Contratación y en contra del parecer y asesoramiento del adjudicatario. Será este último quien habrá de hacerlo constar por escrito al Órgano de Contratación para expresar su desacuerdo con la orden en el plazo máximo de una semana desde su recepción.

b. Seguimiento del contrato.

El Director del Servicio, está facultado para ejercer de una manera continuada y directa el seguimiento, inspección y control de la ejecución del contrato, así como para tramitar las incidencias que surjan y, en general, para comprobar el debido cumplimiento del contrato y la ejecución correcta de su objeto.

El adjudicatario estará obligado a celebrar reuniones periódicas conforme a las exigencias de planificación y coordinación de los trabajos contratados, de las que se levantará acta, para el correcto seguimiento de los mismos, así como para la coordinación de los distintos adjudicatarios que ejecuten obras contempladas en el proyecto, o cualesquiera otras en la parcela o de urbanización en su entorno.

Cuando el adjudicatario o personas que de él dependan incurran en actos u omisiones que contravengan las condiciones necesarias para el correcto cumplimiento del objeto del contrato, el Órgano de Contratación podrá exigir al adjudicatario la adopción de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecución de lo pactado.

El adjudicatario será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las prestaciones realizadas, así como, de las consecuencias que se deduzcan para el Órgano de Contratación o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato, sin perjuicio de las facultades del Órgano de Contratación de inspección y supervisión que resulten necesarias para asegurar la buena marcha del servicio, pudiendo serle exigida la subsanación de los defectos que en ella se detecten.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES . Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.

Pág. 9 / 23

Expediente	Tipo	Procedimiento	Nº Documento
00860-2025/102119	Pliego PT	Solicitudes y remisiones generales	2025/0746774
Cargo	Firmante / Observaciones		Fecha/hora
1 Jefe Sección Protección Forestal	Luis Isaac Berrueto Vegas		18/08/2025 20:21:13
2 Jefe Servicio de Conservación de la Naturaleza y Planificación	Carlos Muro Martinez de Quel / Visto Bueno.		19/08/2025 10:03:15
3 SELLADO ELECTRÓNICAMENTE por Gobierno de La Rioja.	Este documento es una copia fidedigna del almacenado en el repositorio central de documentos electrónicos		19/08/2025 10:03:19

ANEXO I. CONDICIONES Y CONTENIDO DE LOS TRABAJOS Y DOCUMENTOS QUE SE DEBERÁN PRESENTAR Y EJECUTAR PARA EL DESARROLLO DEL PRESENTE CONTRATO EN LA FASE 2: DIRECCIÓN FACULTATIVA, DIRECCIÓN DE OBRA Y DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN.

1. OBJETO Y FUNCIONES DE LA DIRECCION FACULTATIVA.

Esta fase conlleva la prestación de servicios profesionales de Arquitecto, en el libre ejercicio de su especialidad, con competencia para la asunción y desempeño de la Dirección Facultativa de la Obra a que se refiere, en los términos a que se refiere el artículo 12 de la Ley de Ordenación de la Edificación, así como de su Liquidación y Recepción.

Igualmente conlleva la prestación de servicios profesionales de Arquitecto o Arquitecto Técnico o equivalente, en el libre ejercicio de sus respectivas especialidades, para la asunción y el desempeño de la Dirección de la Ejecución de la Obra, en los términos a que se refiere el artículo 13 de la Ley de Ordenación de la Edificación, así como la Coordinación en materia de Seguridad y Salud en las obras.

La Dirección Facultativa de la Obra estará en constante comunicación y coordinación con el/La Representante de la Administración que estará encargado/a de la supervisión de dicha Dirección.

2. OBJETO Y FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN DE OBRA

a. Objeto de la Dirección de Obra

El objeto de la dirección de obra consiste en dirigir el desarrollo de la obra en los aspectos técnicos, estéticos, urbanísticos y medioambientales, de conformidad con el proyecto que la define y demás autorizaciones preceptivas, las condiciones del contrato y las condiciones de adjudicación de las obras.

El cumplimiento de dicho objeto comprende asimismo el desarrollo de todas las actividades necesarias para que la ejecución, el control y el abono de las certificaciones de obras durante la marcha de las mismas y hasta su liquidación, sea el adecuado a las estimaciones previstas.

b. Funciones del Director de Obra.

- El Director de Obra ostentará durante la realización de las obras la representación suficiente del Órgano de Contratación para el ejercicio de sus funciones ante la empresa adjudicataria, las entidades oficiales y particulares, en todos los asuntos relativos a las obras objeto de este contrato, comprometiéndose al cumplimiento de las siguientes funciones:
- Exigir a la empresa constructora adjudicataria de la obra, directamente o a través del personal a sus órdenes, el cumplimiento de las condiciones contractuales con la facultad de controlar totalmente la ejecución de la obra.
- Coordinar el equipo técnico-facultativo de la obra, con la facultad de interpretación técnica, económica y estética resolviendo todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a interpretación de los planos, condiciones de materiales y ejecución de unidades de obra, siempre que no se modifiquen las condiciones del contrato.
- Cuidar que la ejecución de las obras se realice con estricta sujeción al proyecto aprobado o a las

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE			Pág. 10 / 23
en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES. Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.			
Expediente	Tipo	Procedimiento	Nº Documento
00860-2025/102119	Pliego PT	Solicitudes y remisiones generales	2025/0746774
Cargo		Firmante / Observaciones	Fecha/hora
1	Jefe Sección Protección Forestal	Luis Isaac Berruero Vegas	18/08/2025 20:21:13
2	Jefe Servicio de Conservación de la Naturaleza y Planificación	Carlos Muro Martínez de Quel / Visto Bueno.	19/08/2025 10:03:15
3 SELLADO ELECTRÓNICAMENTE por Gobierno de La Rioja. Este documento es una copia fidedigna del almacenado en el repositorio central de documentos electrónicos			19/08/2025 10:03:19

modificaciones debidamente autorizadas en cumplimiento del artículo 242 de la LCSP, así como del cumplimiento del programa de trabajo aprobado y de los plazos de ejecución.

- Adoptar las medidas necesarias para llevar a término el desarrollo del proyecto de ejecución mediante la determinación completa de detalles y especificaciones de todos los materiales, elementos, sistemas constructivos y equipos, estableciendo las adaptaciones, detalles complementarios y modificaciones que puedan requerirse con el fin de alcanzar la realización total de la obra de acuerdo con lo que establece el proyecto de ejecución aprobado y a la normativa de obligado cumplimiento.
- Definir aquellas condiciones técnicas que los pliegos de condiciones o prescripciones correspondientes dejen a su decisión.
- Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el normal cumplimiento del contrato o aconsejen su modificación, tramitando, en su caso, las propuestas correspondientes.
- Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o gravedad, la dirección inmediata de determinadas operaciones o trabajos en curso, dando cuenta al Órgano de Contratación
- Acreditar a la empresa adjudicataria, de las obras realizadas conforme a lo dispuesto en los documentos del contrato.
- Informar al Órgano de Contratación de la marcha e incidencia de las obras emitiendo los informes y certificados que le sean solicitados en el transcurso de las mismas hasta su recepción y liquidación definitivas.
- Gestionar, dentro de sus competencias y atribuciones, cuantos asuntos precise el Órgano de Contratación relacionados con las obras, especialmente todo lo relativo a autorizaciones administrativas (licencias, permisos municipales, etc.).
- Participar en la recepción de obra en los términos establecidos en el artículo 243 de la LCSP y redactar la liquidación de las obras conforme a las disposiciones legalmente establecidas.
- Realizar visitas de obra siempre que sea necesario y/o sea requerido por el Órgano de Contratación, con un mínimo de quince visitas de obra.
- Emitir los siguientes certificados:
 - Certificado final de obra conjunto, con expresa mención del ajuste de la obra realizada al proyecto.
 - Certificado acreditativo de la terminación y disposición.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE			Pág. 11 / 23
en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES. Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.			
Expediente	Tipo	Procedimiento	Nº Documento
00860-2025/102119	Pliego PT	Solicitudes y remisiones generales	2025/0746774
Cargo		Firmante / Observaciones	Fecha/hora
1	Jefe Sección Protección Forestal	Luis Isaac Berruero Vegas	18/08/2025 20:21:13
2	Jefe Servicio de Conservación de la Naturaleza y Planificación	Carlos Muro Martínez de Quel / Visto Bueno.	19/08/2025 10:03:15
3	SELLADO ELECTRÓNICAMENTE por Gobierno de La Rioja. Este documento es una copia fidedigna del almacenado en el repositorio central de documentos electrónicos		19/08/2025 10:03:19

- Todos aquellos informes y certificados requeridos por el Órgano de Contratación durante el periodo de garantía.

3. OBJETO Y FUNCIONES DEL DIRECTOR DE EJECUCIÓN DE OBRA.

a. Objeto de la dirección de ejecución de obra.

El objeto de la dirección de la ejecución de obra consiste en la función técnica de dirigir la ejecución material de la obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la construcción y la calidad de la ejecución de las obras de construcción de los senderos y sus infraestructura asociadas, garantizando que la ejecución de las obras se realice de conformidad con el proyecto que la define y demás autorizaciones preceptivas, las condiciones del contrato y las condiciones de adjudicación de las obras.

El cumplimiento de dicho objeto comprende asimismo el desarrollo de todas las actividades necesarias para que la ejecución, el control y el abono de las obras durante la marcha de las mismas y hasta su liquidación, sea los adecuados a las estimaciones previstas.

b. Funciones del Director de ejecución de obra.

El Director de Ejecución de obra, en la realización de su trabajo, cumplirá las siguientes funciones:

- Exigir a la empresa constructora el cumplimiento de las condiciones contractuales con la facultad de controlar totalmente la ejecución de la obra.
- Inspeccionar los materiales, las dosificaciones y mezclas, realizando el control periódico bastante de la ejecución material, las comprobaciones de las dimensiones y la correcta puesta en obra de los materiales y mezclas, y la disposición de los elementos constructivos, exigiendo los análisis y documentos de idoneidad precisos para su aceptación y definiendo aquellas condiciones técnicas que los pliegos de condiciones o prescripciones dejan a su decisión.
- Cuidar que la ejecución de las obras se realice con estricta sujeción al proyecto aprobado o a las modificaciones debidamente autorizadas y a las prescripciones y órdenes que en su caso emita la Dirección de Obra o el Órgano de Contratación en su condición de Órgano de Contratación a de las obras, así como del cumplimiento del programa de trabajo aprobado y de los plazos de ejecución.
- Organizar con carácter general la ejecución material de la obra de acuerdo con el proyecto que la define y con las instrucciones del Director de Obra en orden al cumplimiento del punto anterior.
- Colaborar con el Director de Obra para llevar a término el desarrollo del proyecto de ejecución mediante la determinación completa de detalles y especificaciones de todos los materiales, elementos, sistemas constructivos y equipos, estableciendo las adaptaciones, detalles complementarios y modificaciones que puedan requerirse con el fin de alcanzar la realización total de la obra, de acuerdo con lo que establece

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE			Pág. 12 / 23
en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES. Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.			
Expediente	Tipo	Procedimiento	Nº Documento
00860-2025/102119	Pliego PT	Solicitudes y remisiones generales	2025/0746774
Cargo		Firmante / Observaciones	Fecha/hora
1	Jefe Sección Protección Forestal	Luis Isaac Berruero Vegas	18/08/2025 20:21:13
2	Jefe Servicio de Conservación de la Naturaleza y Planificación	Carlos Muro Martínez de Quel / Visto Bueno.	19/08/2025 10:03:15
3	SELLADO ELECTRÓNICAMENTE por Gobierno de La Rioja. Este documento es una copia fidedigna del almacenado en el repositorio central de documentos electrónicos		19/08/2025 10:03:19

el proyecto de ejecución aprobado y a la normativa de obligado cumplimiento.

- Colaborar con el Director de Obra en el estudio de las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el normal cumplimiento del contrato o aconsejen su modificación, colaborando, en su caso, en la tramitación de las propuestas correspondientes.
- Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o gravedad, la Dirección inmediata de determinadas operaciones o trabajos en curso, dando cuenta al Órgano de Contratación.
- Acreditar a la empresa adjudicataria de la obra junto con la Dirección de Obra, las obras realizadas conforme a lo dispuesto en los documentos del contrato, midiendo las unidades de obra y confeccionando la relación valorada, de acuerdo con el proyecto de ejecución aprobado, el pliego de condiciones técnicas particulares del proyecto y el presente Pliego de Prescripciones Técnicas.
- Informar a la Dirección de Obra y al Órgano de Contratación de la marcha e incidencia de las obras, emitiendo los informes y certificados que le sean solicitados en el transcurso de las mismas hasta su recepción y liquidación definitivas.
- Gestionar, dentro de sus competencias y atribuciones, cuantos asuntos precise el Órgano de Contratación relacionados con las obras objeto de esta contratación, especialmente todo lo relativo a autorizaciones administrativas que en su caso sean precisas.
- Participar en la recepción de obra y en la redacción de la liquidación de las obras conforme a las disposiciones legalmente establecidas.
- Realizar visitas de obra siempre que sea necesario y/o sea requerido por el Órgano de Contratación con un mínimo de quince visitas de obra.

4. ATRIBUCIONES DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA.

La Dirección Facultativa actuará en completa coordinación con el Órgano de Contratación y deberá asistir a cuantas reuniones o comparecencias fuera requerido por ésta. El Director de Proyecto nombrado por el Órgano de Contratación será la persona responsable del seguimiento y coordinación administrativa de esta obra que actuará como su representante ante la Dirección Facultativa.

I. Órdenes y reclamaciones.

Las instrucciones que el Órgano de Contratación quiera dar a la empresa constructora podrán ser comunicadas o bien a través de la Dirección Facultativa o bien directamente con conocimiento de ésta. Del mismo modo, toda clase de sugerencias y reclamaciones que pudiera plantear la empresa constructora serán formuladas al Órgano de Contratación a través de la Dirección Facultativa y acompañada de informe suscrito por ésta.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES. Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.

Pág. 13 / 23

Expediente	Tipo	Procedimiento	Nº Documento
00860-2025/102119	Pliego PT	Solicitudes y remisiones generales	2025/0746774
Cargo	Firmante / Observaciones		Fecha/hora
1 Jefe Sección Protección Forestal	Luis Isaac Berrueto Vegas		18/08/2025 20:21:13
2 Jefe Servicio de Conservación de la Naturaleza y Planificación	Carlos Muro Martínez de Quel / Visto Bueno.		19/08/2025 10:03:15
3	SELLADO ELECTRÓNICAMENTE por Gobierno de La Rioja. Este documento es una copia fidedigna del almacenado en el repositorio central de documentos electrónicos		19/08/2025 10:03:19

II. Obligaciones de la dirección facultativa.

a. En cuanto al replanteo.

La Dirección Facultativa efectuará las labores de replanteo de las obras en la fecha prevista con el personal designado por la empresa constructora en presencia del Director del Proyecto, suscribiendo y autorizando con su firma el Acta correspondiente que se sujetará a las reglas determinadas en la normativa sobre contratos del sector público y en la Ley de Ordenación de la Edificación y que reflejará, al menos, los siguientes extremos:

- Disponibilidad de los terrenos necesarios.
- Conformidad o disconformidad del replanteo respecto de los documentos contractuales del proyecto.
- Diferencias observadas entre la realidad y las previsiones del proyecto que afecten a la viabilidad de la obra.
- Contradicciones, errores y omisiones observadas en los documentos contractuales del proyecto.
- Cualquier otro punto que pueda afectar al cumplimiento del contrato o viabilidad de la obra.
- Acreditación de viabilidad y orden de iniciación de las obras.

b. Calendario de trabajo.

Si la empresa constructora adjudicataria de la obra propone alguna variación del plan previsto para la ejecución de las obras, estas variaciones serán informadas por la Dirección Facultativa por escrito al Órgano de Contratación para que, si procede, sean aprobadas.

Para ello, la empresa adjudicataria de la obra cuantificará económicamente la variación y la Dirección Facultativa deberá preceptivamente dar su conformidad remitiendo la propuesta, debidamente suscrita, al Órgano de Contratación en los quince (15) días hábiles siguientes, contados a partir de la fecha del acta de comprobación del replanteo e iniciación de obra o del acuerdo de las sucesivas revisiones o actualizaciones.

c. Control de calidad.

La Dirección Facultativa deberá aprobar en el plazo inferior a un mes, el programa de control de calidad de las obras presentado por el adjudicatario de la obra según las especificaciones del Pliego de Condiciones Administrativas Particulares de la obra.

d. Medición, valoración y certificaciones de obra.

Con anterioridad al día treinta (30) de cada mes, la Dirección Facultativa entregará al Órgano de Contratación un borrador de la relación valorada de la obra ejecutada entre los días veinte (20) del mes anterior y el 20 del mes en curso, con la conformidad de la empresa adjudicataria de la obra.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE			Pág. 14 / 23
en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES. Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.			
Expediente	Tipo	Procedimiento	Nº Documento
00860-2025/102119	Pliego PT	Solicitudes y remisiones generales	2025/0746774
Cargo		Firmante / Observaciones	Fecha/hora
1	Jefe Sección Protección Forestal	Luis Isaac Berrueto Vegas	18/08/2025 20:21:13
2	Jefe Servicio de Conservación de la Naturaleza y Planificación	Carlos Muro Martínez de Quel / Visto Bueno.	19/08/2025 10:03:15
3	SELLADO ELECTRÓNICAMENTE por Gobierno de La Rioja. Este documento es una copia fidedigna del almacenado en el repositorio central de documentos electrónicos		19/08/2025 10:03:19

El Órgano de Contratación dispondrá de un plazo de diez (10) días hábiles para examinarla y hacer las observaciones que estime oportunas, o en su caso dar el visado de conformidad para remitirla a la Dirección Facultativa para su firma.

No se entenderá iniciado el plazo para efectuar el examen de las certificaciones de obra hasta tanto el Adjudicatario haya presentado toda la documentación que le compete según lo indicado en los pliegos reguladores de esta contratación. La aprobación, en su caso, por el Órgano de Contratación de cada certificación se comunicará al Adjudicatario quedando éste obligado a la expedición en ese momento de la factura correspondiente y a su remisión al Órgano de Contratación.

En caso de formularse observaciones, la Dirección Facultativa deberá corregir los errores detectados enviando nuevamente la certificación al Órgano de Contratación en el plazo de diez (10) días hábiles.

Una vez otorgada la conformidad por el Órgano de Contratación, dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes a su presentación, se trasladará un ejemplar de la misma a la empresa adjudicataria de la obra y a la Dirección Facultativa.

Dicha certificación incluye la medición de las unidades de obra ejecutadas durante el mes anterior, acreditando, mediante certificación, su ejecución y redactando la correspondiente relación valorada del mes y al origen, por aplicación de los precios contratados a las referidas mediciones. Estas mediciones, certificaciones y valoraciones se realizarán mensualmente durante todo el transcurso de la obra, según el referido plan de trabajo, aun cuando fueran de pequeño volumen o nulas, salvo suspensión de la obra acordada por el Órgano de Contratación. Asimismo, en su caso, suscribirá en los plazos y condiciones procedentes las certificaciones adicionales de revisión de precios, si procede.

e. Modificaciones del proyecto.

Cuando en el transcurso de las obras se detecte la necesidad o conveniencia de realizar alteraciones o reformas del proyecto, debido a circunstancias imprevistas, omisiones o a la iniciativa del Órgano de Contratación, de la empresa constructora o de la Dirección Facultativa, ésta vendrá obligada a dar forma a dichas modificaciones, incluyendo la posible propuesta de precios contradictorios, que habrán de ser previamente aceptados por el Órgano de Contratación. Esta obligación de la Dirección Facultativa se entenderá sin percibir por ello remuneración extraordinaria alguna. La redacción, presentación y tramitación de la documentación que se precise se hará con la anticipación necesaria para no causar mora o suspensión tanto en la tramitación del expediente como en la ejecución de la obra.

f. Informes mensuales y final de obra.

La Dirección Facultativa obtendrá, preparará y elaborará los datos precisos para informar sobre la marcha e incidencias de las obras, pruebas y ensayos, efectuando un informe total de la obra, con entregas mensuales en el que se recojan los siguientes extremos:

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE			Pág. 15 / 23
en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES. Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.			
Expediente	Tipo	Procedimiento	Nº Documento
00860-2025/102119	Pliego PT	Solicitudes y remisiones generales	2025/0746774
Cargo		Firmante / Observaciones	Fecha/hora
1	Jefe Sección Protección Forestal	Luis Isaac Berruero Vegas	18/08/2025 20:21:13
2	Jefe Servicio de Conservación de la Naturaleza y Planificación	Carlos Muro Martínez de Quel / Visto Bueno.	19/08/2025 10:03:15
3	SELLADO ELECTRÓNICAMENTE por Gobierno de La Rioja. Este documento es una copia fidedigna del almacenado en el repositorio central de documentos electrónicos		19/08/2025 10:03:19

- Directorio de obra: Datos generales de la obra, de la Dirección Facultativa completa, colaboradores, adjudicatario general, subcontratistas, etc.
- Análisis de la marcha de la obra, desglosándolo por capítulos, en el que se reflejen las incidencias ocurridas en la misma y las soluciones adoptadas, así como las posibles desviaciones sobre el plan presentado por la empresa adjudicataria de la obra y aprobado por la Dirección Facultativa y el Órgano de Contratación.
- Análisis económico de la marcha de la obra por capítulos y posibles desviaciones con el plan aprobado.
- Análisis de las calidades de las unidades de obra, ejecutadas conforme a proyecto y variaciones de las mismas, si las hubiere, así como su justificación.
- Análisis económico de la marcha de la obra justificando las nuevas unidades de obra y posibles desviaciones en medición comprobándolo con el proyecto contratado.
- Representación fotográfica que defina la evolución de la obra en el periodo del Informe.
- Asimismo, elaborará cuantos informes y certificados le sean solicitados por el Órgano de Contratación, en el transcurso de la obra hasta la finalización del contrato.

g. Recepción de las obras.

La Dirección Facultativa preverá lo necesario para que la recepción de las obras se efectúe dentro del mes siguiente a la fecha de terminación de las obras, según los plazos y el plan de trabajo aprobados, así como la perfecta terminación y remate de las mismas, atendiendo muy especialmente a lo relativo a las acometidas de los suministros y redes de servicios, permisos para la obtención de Licencia de primera ocupación o de actividades según proceda, y del Libro del Edificio referido en el apartado anterior, de forma que el edificio y sus instalaciones puedan ser entregados o cedidos para el uso a que se destinan; y suscribir, en su caso, el correspondiente acta de recepción de las obras, en la fecha fijada de conformidad con el Órgano de Contratación, a fin de que ésta recabe las representaciones que correspondan. Se entenderá que el edificio se puede recibir en el momento en que esté disponible para ser ocupado, con todos los permisos, licencias, autorizaciones y acometidas de servicios.

h. Liquidación de las obras.

La Dirección Facultativa confeccionará y remitirá al Órgano de Contratación antes de la firma del acta de recepción de las obras, el proyecto final de obra con las mediciones de la obra realmente ejecutada y la liquidación de las mismas, firmada y con la conformidad de la empresa constructora aplicando para la liquidación, los precios y condiciones económicas del contrato de obras a la medición general.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

en formato PDF/A 1.7 Firma PADES . Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.

Pág. 16 / 23

Expediente	Tipo	Procedimiento	Nº Documento
00860-2025/102119	Pliego PT	Solicitudes y remisiones generales	2025/0746774
Cargo	Firmante / Observaciones		Fecha/hora
1 Jefe Sección Protección Forestal	Luis Isaac Berrueto Vegas		18/08/2025 20:21:13
2 Jefe Servicio de Conservación de la Naturaleza y Planificación	Carlos Muro Martinez de Quel / Visto Bueno.		19/08/2025 10:03:15
3	SELLADO ELECTRÓNICAMENTE por Gobierno de La Rioja. Este documento es una copia fidedigna del almacenado en el repositorio central de documentos electrónicos		19/08/2025 10:03:19

5. GARANTIA DE LOS TRABAJOS.

El Adjudicatario responderá de la correcta realización de la Dirección de Obra y de la Dirección de Ejecución de Obra, según corresponda y de los posibles defectos que durante la ejecución de obra pudieran incurrirse, sin que sea eximente ni dé derecho alguno la circunstancia de que el Órgano de Contratación los haya supervisado o conocido durante su desarrollo o aceptado en comprobaciones, valoraciones o facturaciones parciales.

6. PLAZOS DE EJECUCIÓN.

El plazo de ejecución de los trabajos se iniciará con la suscripción del acta de replanteo y se ajustará al programa de ejecución de las obras aprobado por el Órgano de Contratación, entendiéndose automáticamente prorrogado si existiera demora justificada de las obras aprobada por este.

Una vez finalizadas las obras, se emitirá el correspondiente Certificado Final de las mismas.

7. RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA.

Además de las que legalmente le corresponden a la Dirección Facultativa (Director de Obra y Director de Ejecución de Obra) en virtud de sus competencias y por aplicación de las normas deontológicas de su profesión, la Dirección Facultativa se responsabilizará expresamente ante el Órgano de Contratación:

- a) Los materiales empleados en la construcción, su puesta en obra, así como la disposición constructiva adoptada sean los adecuados según el proyecto de ejecución redactado o con las modificaciones aprobadas por el Órgano de Contratación y siempre de acuerdo con la normativa vigente, y de que todas las unidades de obra se certifiquen según el mismo criterio y de acuerdo con las condiciones económicas del contrato.
- b) Las demoras o suspensiones de las obras imputables a la propia Dirección Facultativa o a la empresa constructora, en el caso de no haberlo denunciado en el informe correspondiente.

8. PERÍODO DE GARANTÍA.

A la terminación de la obra, tras la recepción de la misma a plena satisfacción del Órgano de Contratación, se producirá la aprobación y el levantamiento del acta de recepción final de los trabajos de Dirección de Obra y Dirección de Ejecución de Obra considerándose finalizado en ese momento el plazo de ejecución de la obra.

El plazo de garantía del contrato se iniciará conforme a lo estipulado en el artículo 243.2 de la LCSP, y su duración quedará determinada en función del periodo de duración de la garantía propuesto por el Adjudicatario en su oferta, siendo éste un periodo mínimo de 12 (DOCE) meses, sin menoscabo de las responsabilidades que legalmente excedan en el tiempo al plazo de garantía.

El Adjudicatario realizará durante el periodo de garantía de las obras, las inspecciones que le sean solicitadas por el Órgano de Contratación emitiendo, en su caso, los informes y certificados que se


DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE			Pág. 17 / 23
en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES. Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.			
Expediente	Tipo	Procedimiento	Nº Documento
00860-2025/102119	Pliego PT	Solicitudes y remisiones generales	2025/0746774
Cargo		Firmante / Observaciones	Fecha/hora
1	Jefe Sección Protección Forestal	Luis Isaac Berruero Vegas	18/08/2025 20:21:13
2	Jefe Servicio de Conservación de la Naturaleza y Planificación	Carlos Muro Martínez de Quel / Visto Bueno.	19/08/2025 10:03:15
3	SELLADO ELECTRÓNICAMENTE por Gobierno de La Rioja. Este documento es una copia fidedigna del almacenado en el repositorio central de documentos electrónicos		19/08/2025 10:03:19

requieran, dictando las oportunas instrucciones para completar, reponer o reparar lo construido con señalamiento de plazos para el debido cumplimiento de las obligaciones de la empresa constructora, hasta la liquidación definitiva de las mismas.


El Órgano de Contratación podrá exigir hasta la finalización del plazo de garantía, la subsanación por el Adjudicatario de los defectos, trabajos incompletos, insuficiencias técnicas, errores materiales, métodos inadecuados, conclusiones incorrectas, omisiones e infracciones de preceptos legales o reglamentarios que a éste le sean imputables, otorgándole al efecto el correspondiente plazo. Si transcurrido el plazo las deficiencias no hubiesen sido corregidas, el Órgano de Contratación optará, atendiendo a las circunstancias concurrentes, por la resolución del contrato, por conceder un nuevo plazo al Adjudicatario, o por admitir el trabajo aplicando la penalidad que considere adecuada.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE			Pág. 18 / 23
en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES. Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.			
Expediente	Tipo	Procedimiento	Nº Documento
00860-2025/102119	Pliego PT	Solicitudes y remisiones generales	2025/0746774
Cargo		Firmante / Observaciones	Fecha/hora
1	Jefe Sección Protección Forestal	Luis Isaac Berruero Vegas	18/08/2025 20:21:13
2	Jefe Servicio de Conservación de la Naturaleza y Planificación	Carlos Muro Martínez de Quel / Visto Bueno.	19/08/2025 10:03:15
3	SELLADO ELECTRÓNICAMENTE por Gobierno de La Rioja. Este documento es una copia fidedigna del almacenado en el repositorio central de documentos electrónicos		19/08/2025 10:03:19

ANEXO II. PLANOS PLANTA BAJA Y PRIMERA

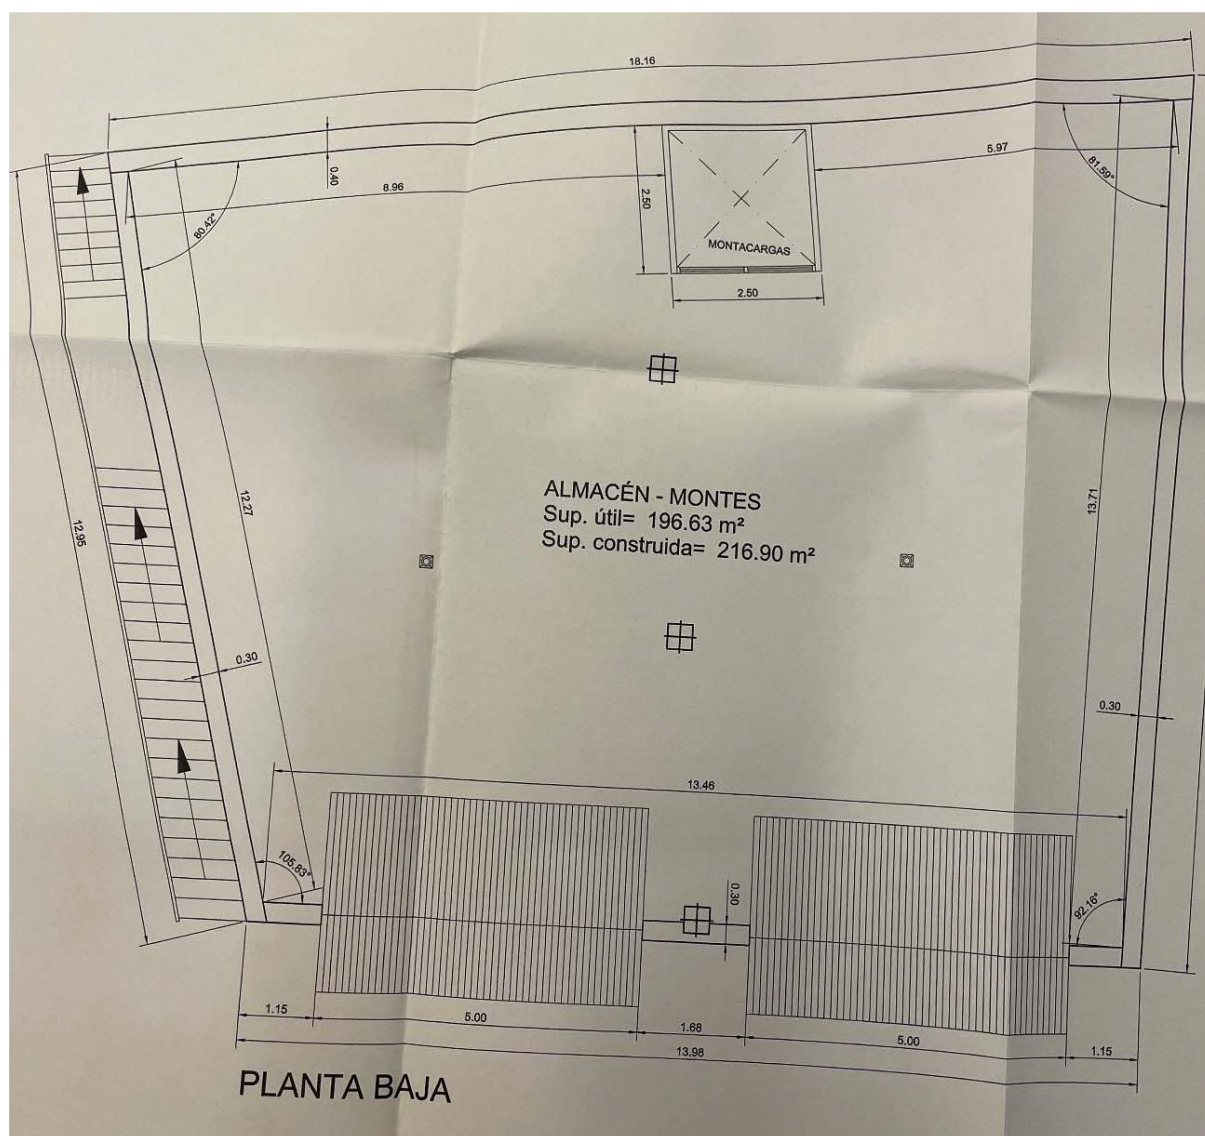

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE				en formato PDF/A 1.7 Firma PADES . Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.	Pág. 19 / 23	
Expediente	Tipo	Procedimiento			Nº Documento	
00860-2025/102119	Pliego PT	Solicitudes y remisiones generales			2025/0746774	
Cargo	Firmante / Observaciones			Fecha/hora		
1 Jefe Sección Protección Forestal	Luis Isaac Berruero Vegas			18/08/2025 20:21:13		
2 Jefe Servicio de Conservación de la Naturaleza y Planificación	Carlos Muro Martínez de Quel / Visto Bueno.			19/08/2025 10:03:15		
3 SELLADO ELECTRÓNICAMENTE por Gobierno de La Rioja. Este documento es una copia fidedigna del almacenado en el repositorio central de documentos electrónicos						

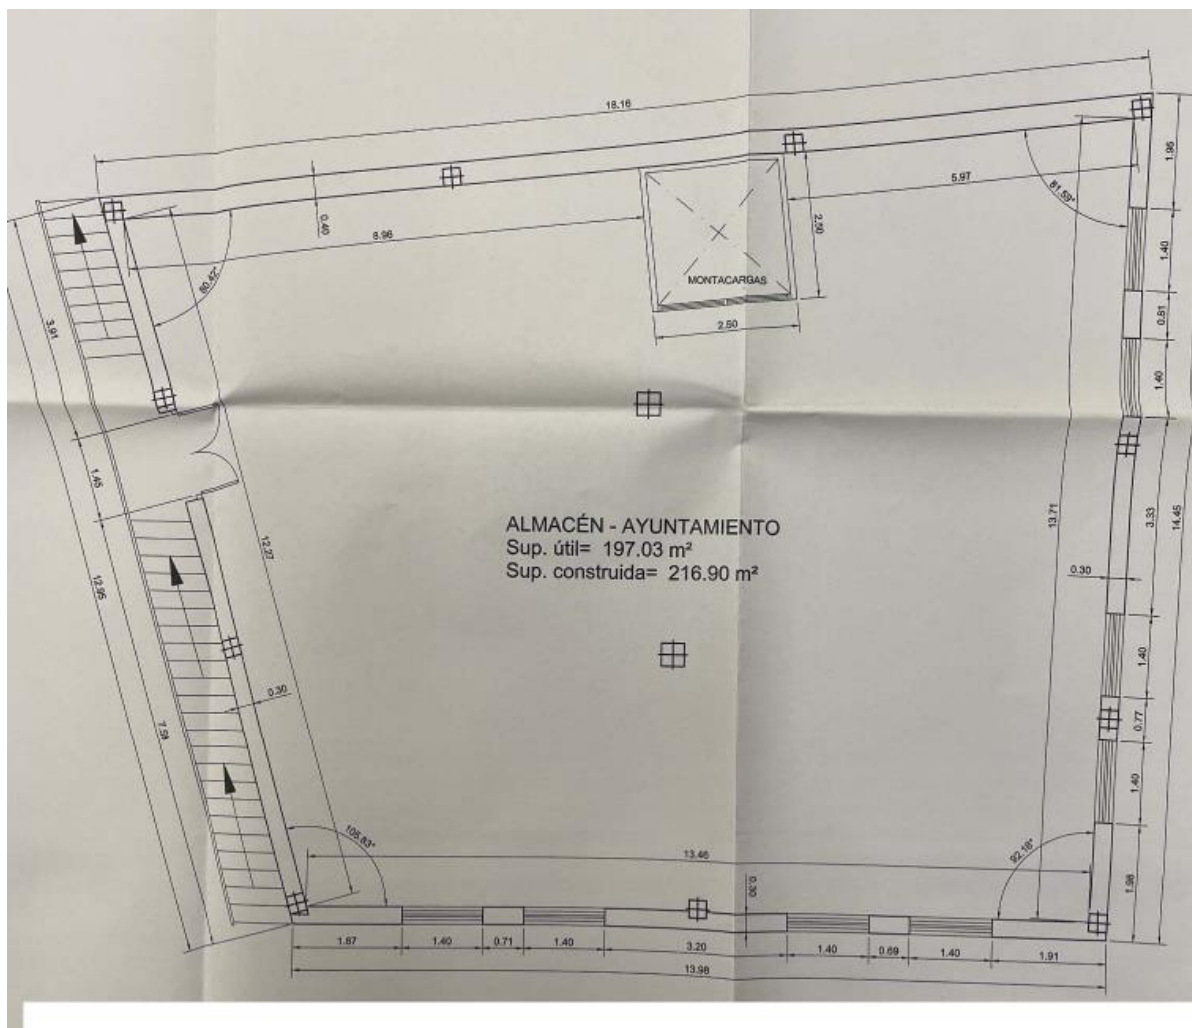

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE			Pág. 20 / 23
en formato PDF/A 1.7 Firma PADES. Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.			
Expediente	Tipo	Procedimiento	Nº Documento
00860-2025/102119	Pliego PT	Solicitudes y remisiones generales	2025/0746774
Cargo		Firmante / Observaciones	Fecha/hora
1 Jefe Sección Protección Forestal		Luis Isaac Berruero Vegas	18/08/2025 20:21:13
2 Jefe Servicio de Conservación de la Naturaleza y Planificación		Carlos Muro Martínez de Quel / Visto Bueno.	19/08/2025 10:03:15
3 SELLADO ELECTRÓNICAMENTE por Gobierno de La Rioja.		Este documento es una copia fidedigna del almacenado en el repositorio central de documentos electrónicos	

ANEXO III. FOTOGRAFÍAS EXTERIOR E INTERIOR DEL EDIFICIO A REMODELAR

EXTERIORES y PLANTA BAJA





DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

en formato PDF/A 1.7 Firma PADES. Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.

Pág. 21 / 23

Expediente	Tipo	Procedimiento	Nº Documento
00860-2025/102119	Pliego PT	Solicitudes y remisiones generales	2025/0746774
Cargo		Firmante / Observaciones	Fecha/hora
1	Jefe Sección Protección Forestal	Luis Isaac Berruero Vegas	18/08/2025 20:21:13
2	Jefe Servicio de Conservación de la Naturaleza y Planificación	Carlos Muro Martínez de Quel / Visto Bueno.	19/08/2025 10:03:15
3	SELLADO ELECTRÓNICAMENTE por Gobierno de La Rioja.		19/08/2025 10:03:19

Este documento es una copia fidedigna del almacenado en el repositorio central de documentos electrónicos

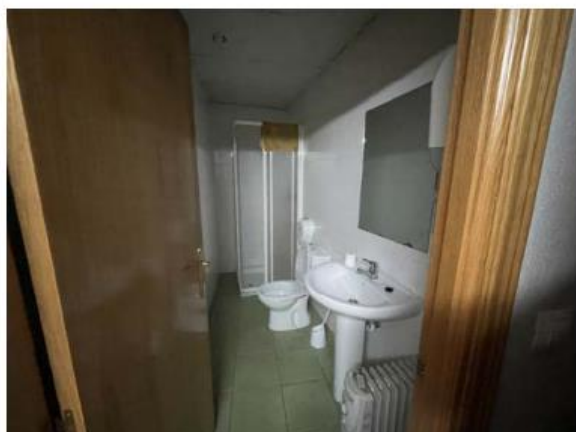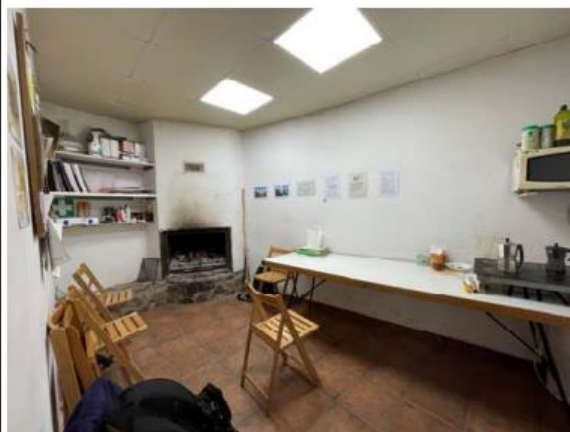

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE			en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES . Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.	Pág. 22/ 23
Expediente	Tipo	Procedimiento	Nº Documento	
00860-2025/102119	Pliego PT	Solicitudes y remisiones generales	2025/0746774	
Cargo	Firmante / Observaciones		Fecha/hora	
1 Jefe Sección Protección Forestal	Luis Isaac Berruero Vegas		18/08/2025 20:21:13	
2 Jefe Servicio de Conservación de la Naturaleza y Planificación	Carlos Muro Martínez de Quel / Visto Bueno.		19/08/2025 10:03:15	
3 SELLADO ELECTRÓNICAMENTE por Gobierno de La Rioja.	Este documento es una copia fidedigna del almacenado en el repositorio central de documentos electrónicos		19/08/2025 10:03:19	

PRIMERA PLANTA



DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE				en formato PDF/A 1.7 Firma PADES. Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.	Pág. 23 / 23
Expediente	Tipo	Procedimiento	Nº Documento		
00860-2025/102119	Pliego PT	Solicitudes y remisiones generales	2025/0746774		
Cargo		Firmante / Observaciones	Fecha/hora		
1 Jefe Sección Protección Forestal		Luis Isaac Berrueco Vegas	18/08/2025 20:21:13		
2 Jefe Servicio de Conservación de la Naturaleza y Planificación		Carlos Muro Martinez de Quel / Visto Bueno.	19/08/2025 10:03:15		
3 SELLADO ELECTRÓNICAMENTE por Gobierno de La Rioja.		Este documento es una copia fidedigna del almacenado en el repositorio central de documentos electrónicos	19/08/2025 10:03:19		
